

PRÍLOHA 1

Dobrý den pane Slezák, mohl byste mi prosím objasnit následující položky z rozpočtu stavby autobusového zálivu na Morávce a odpovédět na přiložené otázky, jak jsem byl vyzván paní starostkou k objasnění?

		SO 801 Vegetační úpravy - kdy byly zahájeny a kdy ukončeny?				
		SO 101 Autobusová zastávka a chodník				
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	87,000	
5	Ā	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	87,000	Kdy a kde byla uložena sypanina?
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	130,500	
37	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	338,000	Co je to za množství zeminy?
39	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	338,000	Kde se toto množství odvezlo a uskladnilo?
41	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	341,000	Kde se toto množství odvezlo a uskladnilo?
42	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	507,000	Komu se platilo za uskladnění tohoto množství?
44	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	154,075	Co je to za množství a k čemu se využilo?
67	K	458501112	Výpiňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drčeného	m3	315,000	Co je to za množství a k čemu se využilo?
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	94,000	Proč došlo v dodatku č.1 k tak výraznému navýšení z částky 100,- Kč na 911,- Kč za m3? Ve třídě 5 mohlo být tak max. 50 % zeminy.

Za Vaše vyjádření a vysvětlení předem děkuji. Jan Legerský

Autobusový záliv Morávka

Dotazované položky rozpočtu:

Vegetační úpravy – byly předmětem změnového listu, část prováděla obec

1. 12. 04. 2019 zahájeny práce, výkopy pod tělesem zastávky, včetně zatrubnění odvodnění dle PD
5. Sypanina odvezena a uložena na skládku
6. DTTO
37. Odtěžení svahu včetně prostoru za stávající autobusovou zastávkou, skutečnost odtěžení je ve výši 490 m³ oproti účtované výměře
39. Součást odpočtu MNP
41. Navezeno na plochu k restauraci cca 490 m³ nikoli 341 m³
42. Součást odpočtu MNP
44. Závoz za zhotovenou část stěny palisády a stěny za Autobusovou zastávkou
67. Návoz přebytku zeminy restaurace
1. Odečtena třída zeminy oproti zadání a dopočtena třída zeminy dle skutečnosti. Výměra měla být ve výši poloviny z 338 m³, ve vyúčtování činí pouze cca 1/3 skutečnosti (94 m³).

Současně s tím zhotovitel provedl nový propustek pod zastávkou bez úhrady a provedl dohodu o narovnání, kdy mu nebyly uznány náklady ve výši cca 50.tis.

Zpracoval: Miroslav Slezák



Digitálně podepsal
Miroslav Slezák
Datum: 2019.11.12
06:15:06 +01'00'



K2 stavební Moravia s.r.o.
Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Zapsána v OR dne 2. 2. 2009 u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 32700



Zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo její dokončené části

ze dne: **28. 06. 2019**

Název stavby (nebo její dokončené části):

„Autobusová zastávka Morávka – přehrada II“

Předávající (zhotovitel):

K2 stavební Moravia s. r. o., IČ 28573994, Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Přebírající (objednatel):

Obec Morávka, IČO: 00296945, Morávka 599, 739 04 Pražmo

Technický popis:

Jedná se o dopravní stavbu, novostavbu zastávkového zálivu, nástupiště, zatrubnění odvodňovacího příkopu, palisádových zdí a zdí z betonových svahovek, terénní úpravy svahu a ochranu inženýrských sítí.

Místo stavby: Obec Morávka	Katastrální území:	Číslo parcely:
Číslo stavby: R172	GP:	PD – HaskoningDHV CR, spol. s r.o.
SOD č. ze dne 28.2.2019 Dodatek č. 1 ze dne 28.6.2019	Celková cena bez DPH: 1 763 316,68 Kč	DPH:
Zálohováno:	Fakturováno:	Pozastávka:
Zahájení prací: 8. 4. 2019 Viz. zápis ve SD	Dokončení prací: 28. 6. 2019	
Další ujednání:		

Po prohlídce uvedené stavby / objektu, její technické dokumentace, stavebního deníku a ostatních dokladů proběhlo převzetí řízení. Zástupce zhotovitele předává a zástupce objednatele výše uvedenou stavbu / objekt převímá. Provedené práce odpovídají platné projektové dokumentaci včetně jejích změn a SOD uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem včetně jejich dodatků. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany, že se tak stalo s vědomím a schválením objednatele, resp. podle jeho příkazů. Odchylnky od projektu jsou zakresleny v předávané dokumentaci skutečného provedení. Práce jsou provedeny bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily převzetí stavby / objektu.

Objednatel prohlašuje, že převímá výše uvedenou stavbu ke dni **28. 6. 2019** do vlastní správy, užívání a udržování a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků, než je níže uvedeno.

Soupis drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí:

Termín odstranění:

Soupis výsledků zkoušek a kontrol s hodnocením: viz. předávací dokumentace:

Unigeo

Soupis předaných dokladů:

1. PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE
3. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ODSTRANĚNÍ ODPADŮ
4. STAVEBNÍ DENÍK
5. FOTODOKUMENTACE
6. ZKOUŠKY
7. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
8. GEOMETRICKÝ PLÁN
9. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Záruční doba dle SOD činí :
- 60 měsíců

začíná běžet ode dne 28. 6. 2019

Přejímací řízení zahájeno dne: 28. 6. 2019


Přejímací řízení ukončeno dne: 28. 6. 2019



Vyklizení staveniště provede zhotovitel v termínech: do 5 dnů od předání stavby objednateli

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele	Jaromír Kubala	Jednatel společnosti	
	Ing. Roman Břenek, Ph.D.	Stavbyvedoucí	
Zástupci objednatele	Mgr. Gabriela Daňková	Starostka obce	
	Miroslav Slezák	TDI	
Ostatní účastníci řízení			
Rozdělovník:		Přílohy:	

Dobry den pane Slezak, mohl byste mi prosim objasnit nasledujici polozky z rozpoctu stavby autobusoveho zalivu na Moravce a odpovedet na prilozene otazky, jak jsem byl vyzvan pani starostkou k objasneni?										Uhrazené, ale nezrealizované a nedodané		
SO 801 Vegetační úpravy - kdy byly zahájeny a kdy ukončeny? - NEBYLO JEŠTĚ 16.8.2019 - PROVÁDĚLA JINÁ FIRMA, PLACENO GEN. DODAVATELI										46 388 Kč		
SO 101 Autobusová zastávka a chodník												
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	87,000							
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	87,000	Kdy a kde byla uložena sypanina?						
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	130,500							8 700 Kč
37	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	338,000	Co je to za množství zeminy?						33 800 Kč
39	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	338,000	Kde se toto množství odvezlo a uskladnilo?						60 840 Kč
41	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	341,000	Kde se toto množství odvezlo a uskladnilo?						3 410 Kč
42	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	507,000	Komu se platilo za uskladnění tohoto množství?						35 490 Kč
44	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	154,075	Co je to za množství a k čemu se využilo?						68 255 Kč
67	K	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drceného	m3	315,000	Co je to za množství a k čemu se využilo?						31 500 Kč
1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	94,000	Proč došlo v dodatku č.1 k tak výraznému navýšení z částky 100,- Kč na 911,- Kč za m3? Ve třídě 5 mohlo být tak max. 50 % zeminy.						36 000 Kč
Za Vaše vyjádření a vysvětlení předem děkuji. Jan Legerský										324 383 Kč		
										58 379 Kč		
										392 503 Kč		
										DPH 21%		

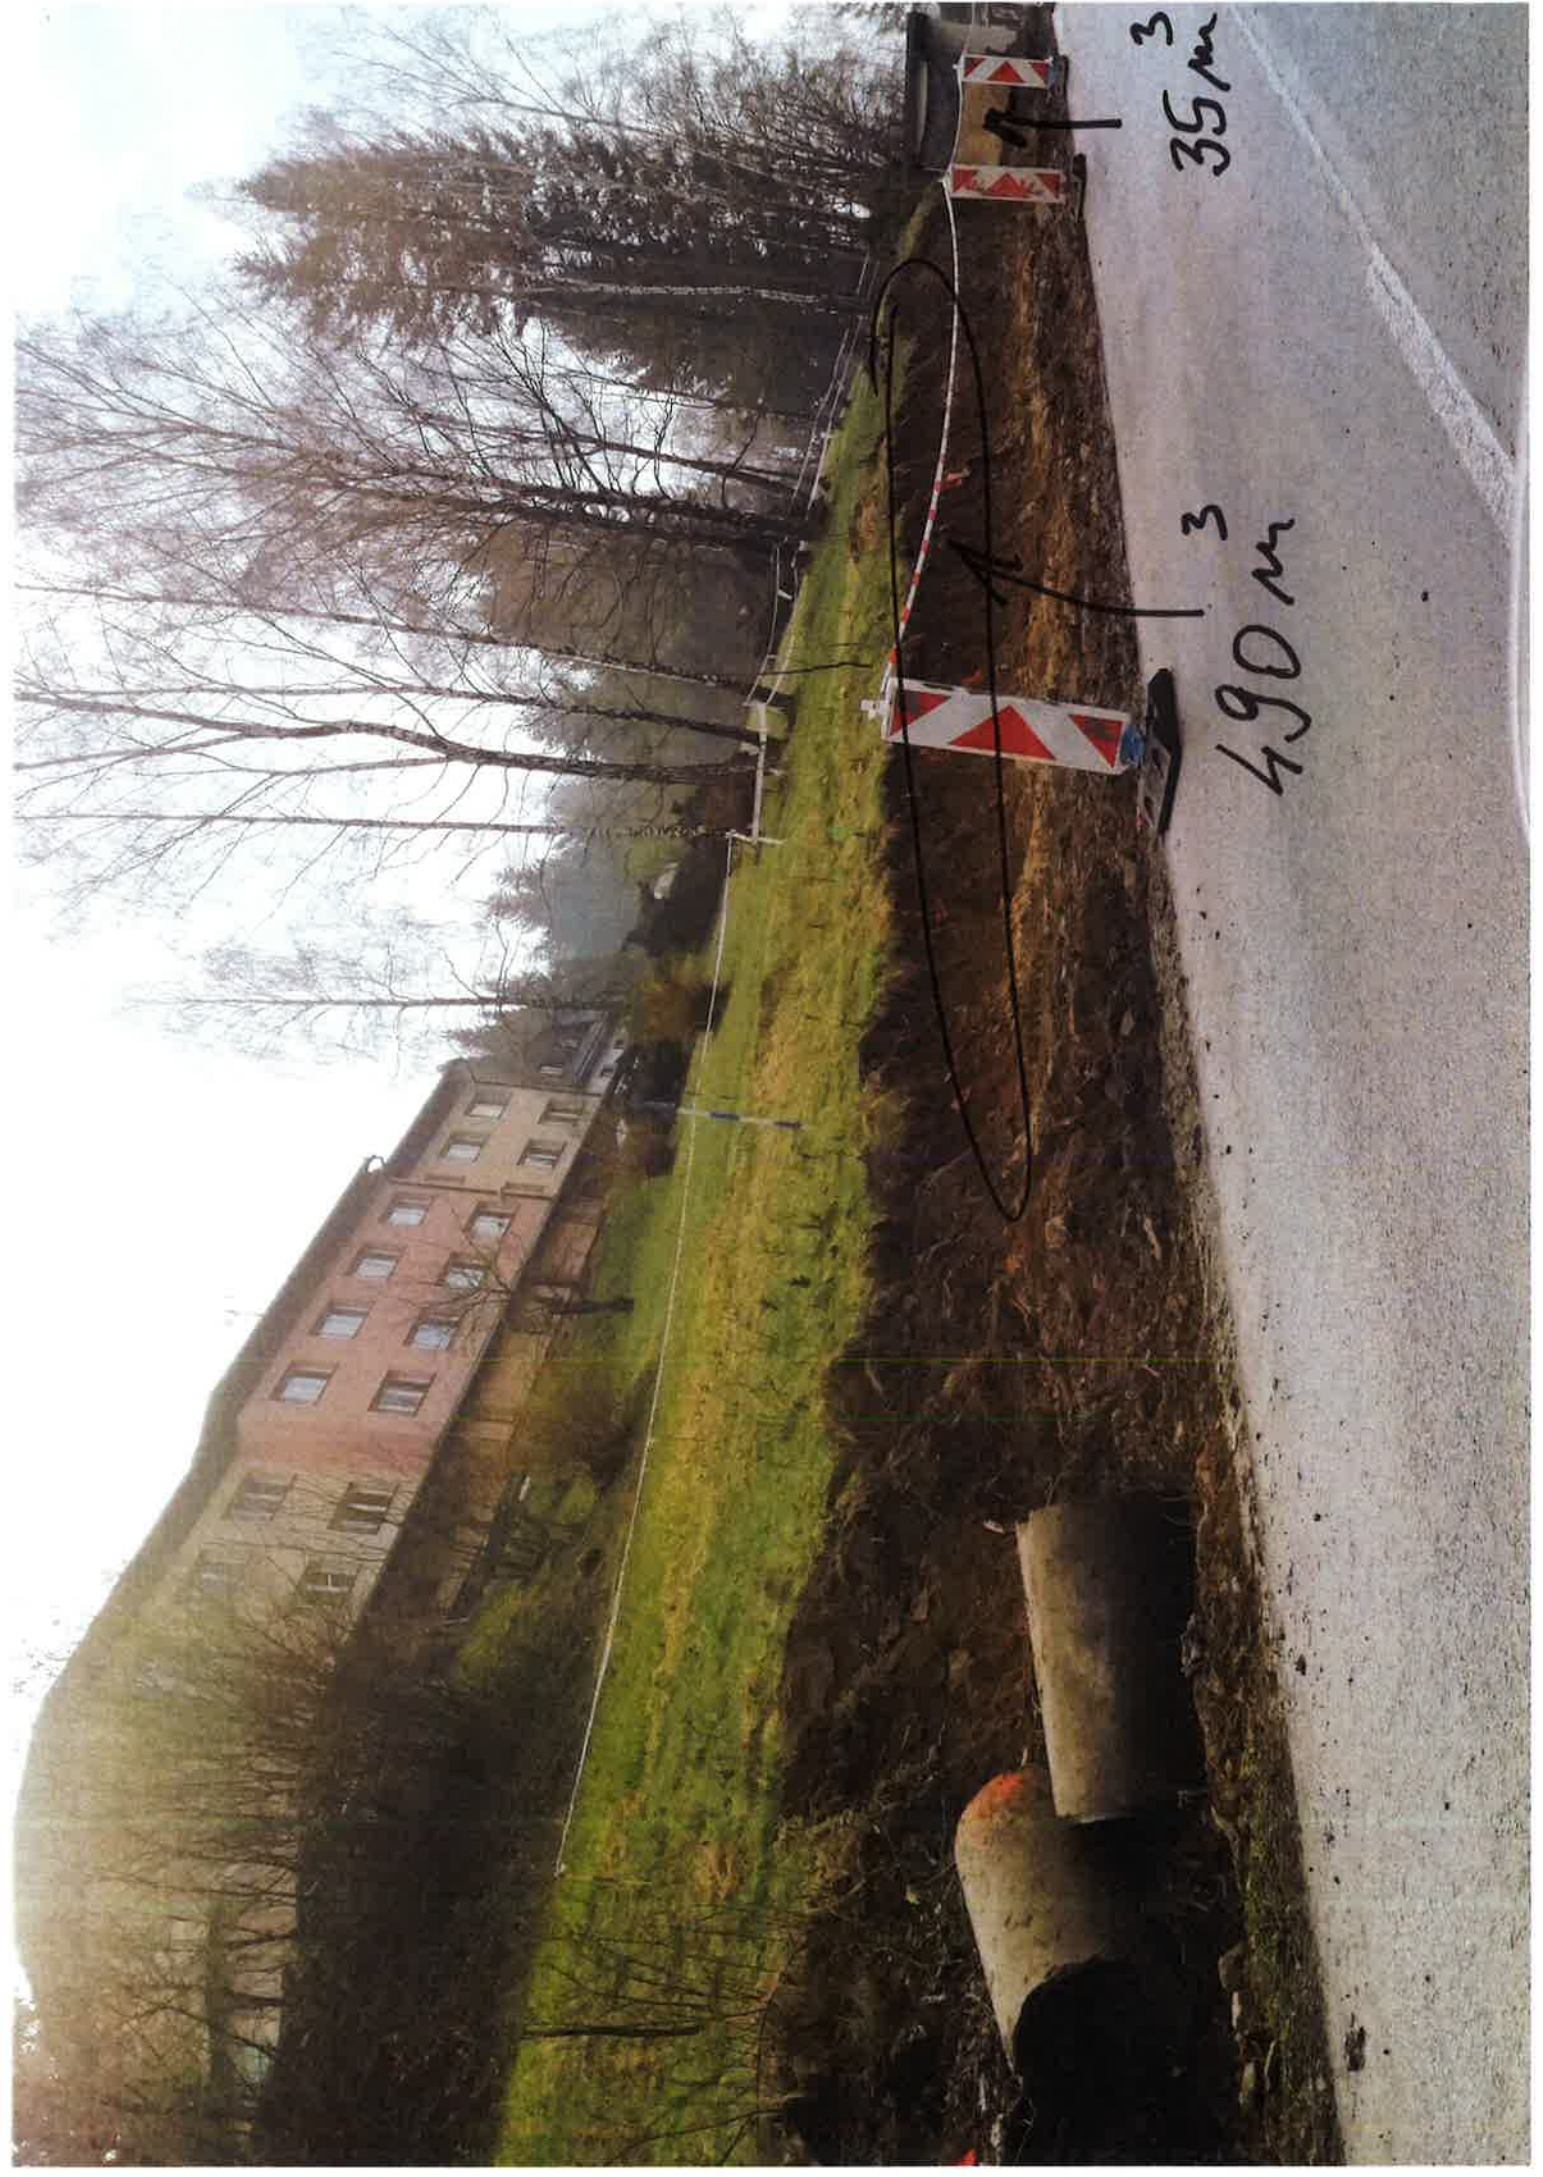


35 m³

490 m³



35 m³

3,15 m³ (???)

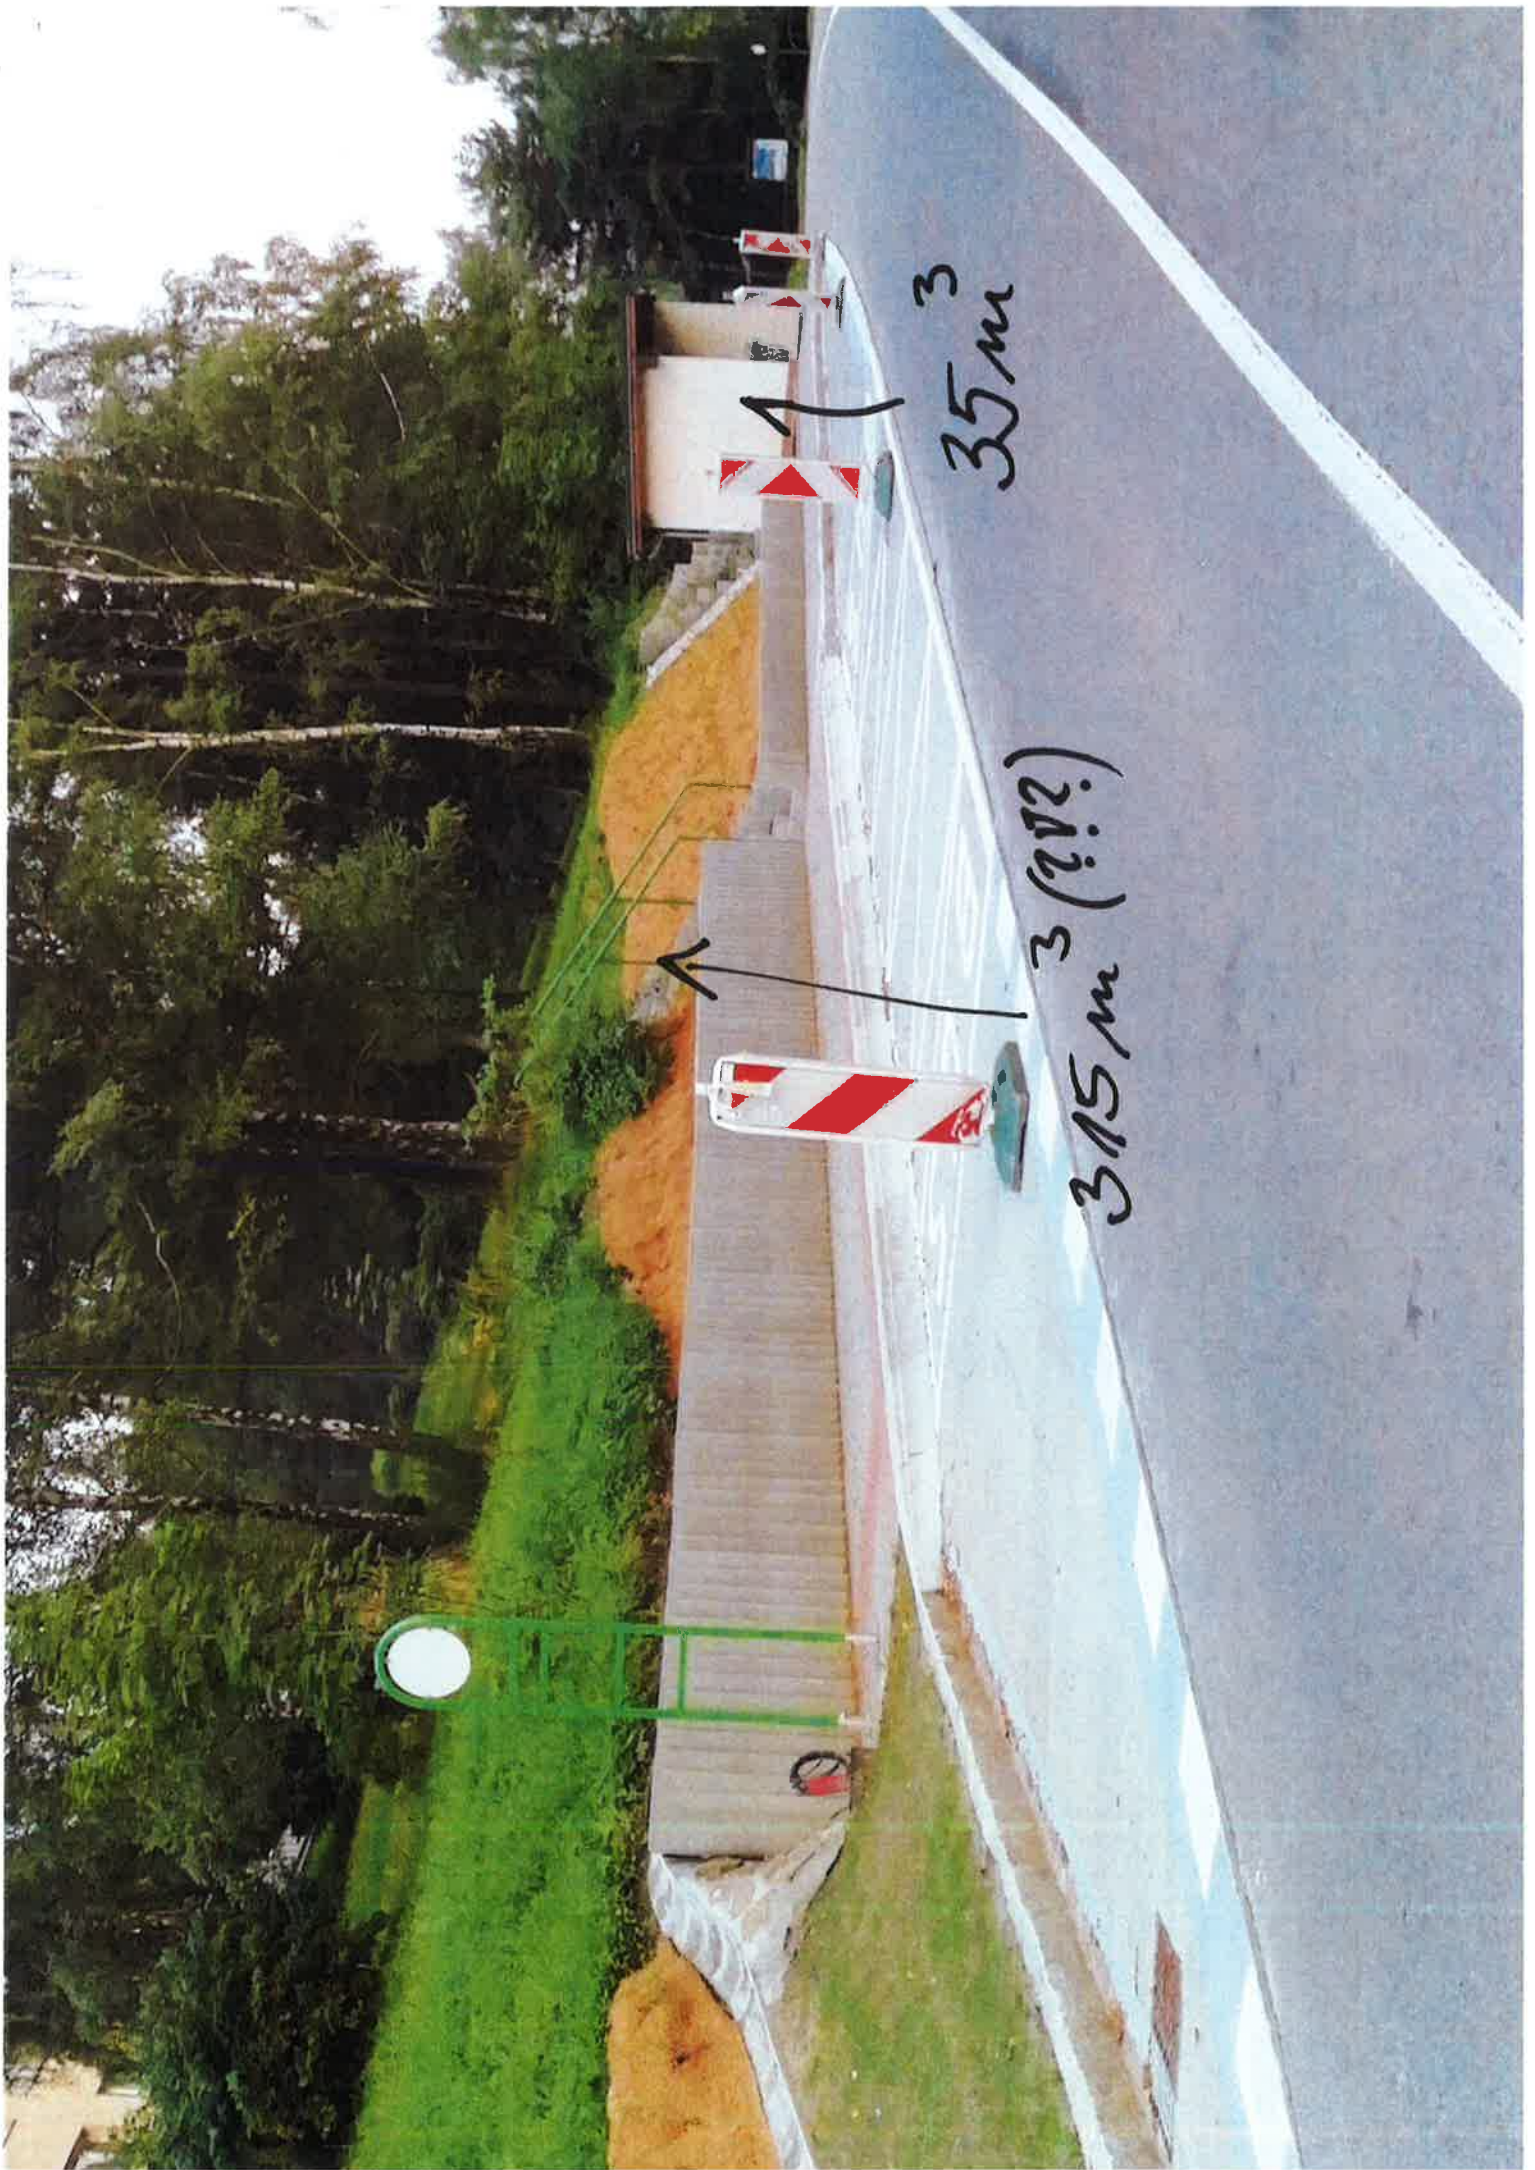

35 m




315 m 3 (iv?)





SPRAVNÝ
SKLON,
ODTOKOVÉHO
ŽLABU ?



KDE
TEČE
VOĎA ?
DO KOPCE ?
